



Ministério dos Transportes
Gabinete do Ministro
Assessoria Parlamentar

Ofício nº 195 /GM/MT

Brasília, 13 de Fevereiro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador **LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL**
Presidente da Câmara Municipal de Paraty
Estado do Rio de Janeiro

Assunto: **BR-101/RJ/SP - Intervenção de trecho da rodovia.**

Senhor Presidente,


Incumbiu-me o Senhor Ministro de Estado dos Transportes, César Borges, de reportar-me ao Ofício CD nº 436/2013, de 10 de dezembro de 2013, recebido nesta Pasta por meio da Presidência da República, no qual Vossa Excelência solicita intervenção do trecho compreendido entre o Município de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, e Ubatuba, no Estado de São Paulo, em prol da Segurança na BR-101/RJ/SP.

A respeito, conforme disposto no Capítulo VII, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, encaminhado, para o conhecimento do ilustre Presidente, a cópia do Ofício nº 144/2014/DIREX, de 22 de janeiro de 2014, elaborado pela Diretoria Executiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, juntamente com as informações prestadas pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa daquele Departamento, contendo os esclarecimentos sobre o assunto em questão.


Atenciosamente,



GEÓRGENOR CAVALCANTE PINTO
Chefe da Assessoria Parlamentar

DEFERIDO


LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL

Paraty, 02/03/14


Assinatura Luciano de Oliveira Vidal



DNIT

Diretoria Executiva
Ofício nº 144 /2014/DIREX

Brasília, 22 de janeiro de 2014.

Ao Senhor
GEORGENOR CAVALCANTE PINTO
Chefe da Assessoria Parlamentar
Ministério dos Transportes
Brasília/DF

Referência: **Ofício nº 2997/2013/MT/ASPAR**
Assunto: **BR-101/SP/RJ - Intervenção de rodovia.**

Senhor Chefe da Assessoria Parlamentar,

Versa o presente expediente sobre o Requerimento nº 120/2013, de autoria do Vereador Luciano de Oliveira Vidal, da Câmara Municipal de Paraty, no Estado do Rio de Janeiro, o qual requer a intervenção do trecho compreendido entre o Município de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, e Ubatuba, no Estado de São Paulo, por parte do DNIT em prol da segurança na BR-101/RJ/SP.

A esse respeito, após esclarecimentos prestados pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa, incumbiu-me o Senhor Diretor Executivo de informar que o referido trecho de rodovia está inserido no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, conforme Memorando nº 048/2014/DPP, e, no momento, estão em elaboração os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA para verificar tecnicamente quais melhorias devem ser implantadas a fim de adequar a trafegabilidade e segurança dos usuários aos padrões de qualidade exigidos pelo DNIT.

Atenciosamente,

DEFERIDO
[Assinatura]
e PUBLICADO

[Assinatura]
ZENO JOSÉ ANDRADE GONÇALVES
Gerente de Projeto/DIREX

Paraty, 22 de 01/2014

Assinatura / Carimbo

[Assinatura]
Luciano de Oliveira Vidal
Presidente

SICAP/GM/MT
Em 22 de 01/2014
2013.00188464

Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Memorando nº 048/2014/DPP


Brasília, 14 de janeiro de 2014.

À Diretoria Executiva.

Assunto: BR-101/SP/RJ – Intervenção em prol da segurança na rodovia.
Anexo: Memorando nº 029/2014/DIREX.

1. Trata o presente de solicitação da Câmara Municipal de Paraty/RJ para intervenção em prol da segurança na rodovia BR-101/RJ/SP, no trecho entre Ubatuba/SP e aquele Município.
2. Rogamos informar que o referido trecho de rodovia está inserido no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, cujas ações estão discriminadas nas fichas de acompanhamento em anexo, demonstrando que estão em elaboração os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA para verificar tecnicamente quais as melhorias devem ser implantadas visando adequar suas trafegabilidade e segurança dos usuários aos padrões de qualidade exigidos por este DNIT.

Atenciosamente,



José Florentino Caixeta
Diretor de Planejamento e Pesquisa

Recebido em 14/01/14
Apoio/DIREX

Assinatura

DEFERIDO
COM ASSINATURA
E PUBLICAÇÃO

Paraty, 07/03/14

Assinatura / Carimbo

Luciano de Oliveira Vidal
Presidente

BR-101/RJ - Adequação de Capacidade (Mangaratiba - DIV RJ/SP)

Mangaratiba

Km 428,1

170,4 km

UF: RJ

EXECUTOR: DNIT

META - PAC: 170,00 Km

INVEST. TOTAL: R\$ 665,0 milhões

DATA DE INÍCIO: 30/06/2014

DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2017

ESTÁGIO: Ação Preparatória



RESULTADOS

- > LICENCIAMENTO AMBIENTAL
- > IBAMA emitiu TR definitivo para EIA/RIMA em 28/02/2011
- > EIA/RIMA - RDC eletrônico nº 308/13-00. Abertura das propostas realizada em 09/07/2013
- > PROJETO
- > EVTEA - pregão eletrônico 072/2013-00 homologado em 16/04/2013. Empresa vencedora: Dynatest, contratada em 26/09/2013.

PROVIDÊNCIAS

- > LICENCIAMENTO AMBIENTAL
- > EIA/RIMA: contratar até 30/01/2014 e concluir até 30/07/2014
- > LP solicitar até 30/07/2014 e obter até 30/10/2014.
- > Concluir PBA e solicitar LI até 30/01/2015; LI obter até 30/03/2015
- > PROJETO
- > Aprovar EVTEA até 26/07/2014 e transformar em anteprojeto até 30/09/2014.
- > PBIPE - Licitar por RDC Integrada até 30/10/2014, após LP.
- > OBRAS
- > Contratar até 30/01/2015
- > Iniciar até 28/02/2015
- > Concluir até 28/02/2018

Km 598,5

Divisa RJ/SP

DEFERIDO

Carla F. Pereira
R. A. B. Silva

Paraty, RJ

Assinatura / Carimbo

Carla F. Pereira
R. A. B. Silva

Liciana de Oliveira Vidal
Presidente

Dezembro/2013

BR-101/SP - Adequação Divisa RJ/SP - Ubatuba, incluindo a Travessia de Ubatuba

Divisa RJ/SP

Km 0

BR 101/SP

44,1 km

Km 44,1

Área Urbana de Ubatuba

9,2 km

Km 53,3

Ubatuba (Praia Grande)

UF: SP

EXECUTOR: DNIT

META - PAC: 53,00 Km

INVEST. TOTAL: R\$ 155,0 milhões

DATA DE INÍCIO: 30/04/2014

DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2017

ESTÁGIO: Ação Preparatória



RESULTADOS

> LICENCIAMENTO AMBIENTAL

> Trecho km 0 - km 44,1 - IBAMA - emitiu TR definitivo para EIA/RIMA em 28/02/2011

> EIA/RIMA - edital n° 308/2013 (RDC) publicado no DOU de 10/06/2013; abertura das propostas em 09/07/2013

> Trecho km 44,1 - km 53,3 - LP emitida em 08/04/2014; renovada em 09/04/2013 (válida por 2 anos)

> Travessia de Ubatuba - PBA - Publicada vencedora da licitação no DOU de 16/08/2013

> PROJETO

> EVTEA - pregão eletrônico 072/2013-00; homologado e contratado em 26/09/2014; Empresa vencedora: Dynatest,

PROVIDÊNCIAS

> LICENCIAMENTO AMBIENTAL

> TRECHO KM 0,0 - KM 44,1

> EIA/RIMA; contratar até 30/01/2014 e concluir até 30/07/2014


DEFERIDO

[Handwritten signature]

Paraty *[Handwritten signature]*

Assinatura: *[Handwritten signature]*

BR-101/SP - Adequação Divisa RJ/SP - Ubatuba, Incluir Pista Travessia de Ubatuba

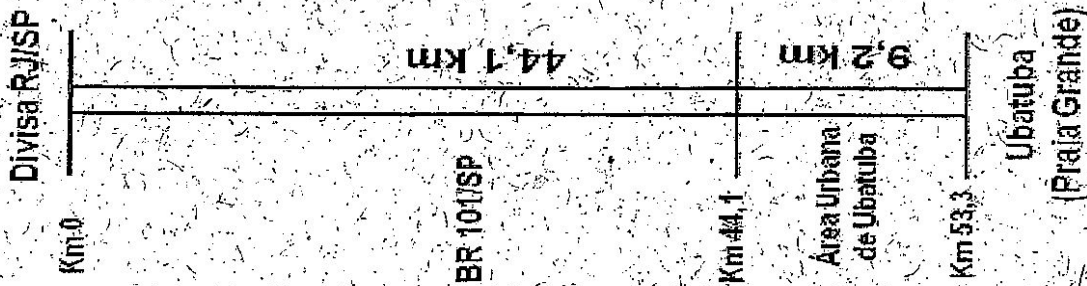

PROVIDÊNCIAS

- LP solicitar até 30/07/2014 e obter até 30/10/2014
- Concluir PBA e solicitar LI até 30/01/2015
- LI obter até 30/03/2015
- TRECHO KM 44,1 - KM 53,3 - TRAVESSIA URBANA DE UBATUBA
- PBA - concluir até 30/04/2014
- LI solicitar até 30/04/2014 e obter até 30/06/2014
- PROJETO
- TRECHO KM 0,0 - KM 44,1
- PBIPE - Aprovar EVTEA até 26/07/2014 e transformar em anteprojeito até 30/09/2014
- TRECHO KM 44,1 - KM 53,3 - TRAVESSIA URBANA DE UBATUBA
- PE - aprovar até 30/01/2014
- OBRA
- TRECHO KM 0,0 - KM 44,1
- Licitar por RDC Integrada até 30/10/2014
- Contratar até 30/01/2015
- Iniciar até 28/02/2015
- Concluir até 28/02/2015
- TRECHO KM 44,1 - KM 53,3 - TRAVESSIA URBANA DE UBATUBA
- Licitar até 28/02/2014
- Contratar até 30/05/2014
- Iniciar até 30/06/2014, após LI
- Concluir até 30/06/2016

DEFERIDO

SOL. SERRAVALLE
S. P. B. L. U. A. L.

Peraty, *DE FICHIL*

Assinatura CC

Gerente de Operações Presidente

DIRETORIA EXECUTIVA
Assessoria Parlamentar

Memorando nº 36 /2014/DIREX

Brasília, 07 de janeiro de 2014.

A Diretoria de Planejamento e Pesquisa

Referência: **Ofício CD Nº 436/2013**
Assunto: **Requerimento Nº 120/2013.**

Senhor Diretor,

Versa o presente expediente sobre o Requerimento nº 120/2013, de autoria do Vereador Luciano de Oliveira Vidal, da Câmara Municipal de Paraty, o qual requer a intervenção por parte deste Departamento em prol da segurança na BR-101/RJ/SP, no trecho compreendido entre o Município de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, e Ubatuba, no Estado de São Paulo.

A esse respeito, incumbiu-me o Senhor Diretor Executivo de encaminhar a presente documentação a Vossa Senhoria, solicitando relatar as ações programadas por este Departamento que vão ao encontro do ora solicitado.

Se possível, solicito encaminhar as informações pertinentes a esta DIREX, até o dia 27/01/2014.

Atenciosamente,

ZENO JOSÉ ANDRADE GONCALVES
Gerente de Projeto/DIREX

DEFERIDO
*Sol. PUBLICADO
& RELEVANTE*

Paraty, 07/01/14
Luciano de Oliveira Vidal
Assinatura / Carimbo
Luciano de Oliveira Vidal
Presidente

Recebido na DPP
08/01/14
14:45
[Signature]
